




# Raccordement au réseau public de transport d'électricité de la ferme pilote de « Groix & Belle-Île »



## **Instance de concertation et de suivi**

Mardi 18 décembre 2018  
Préfecture du Morbihan - Vannes


# Tracé général de raccordement en mer

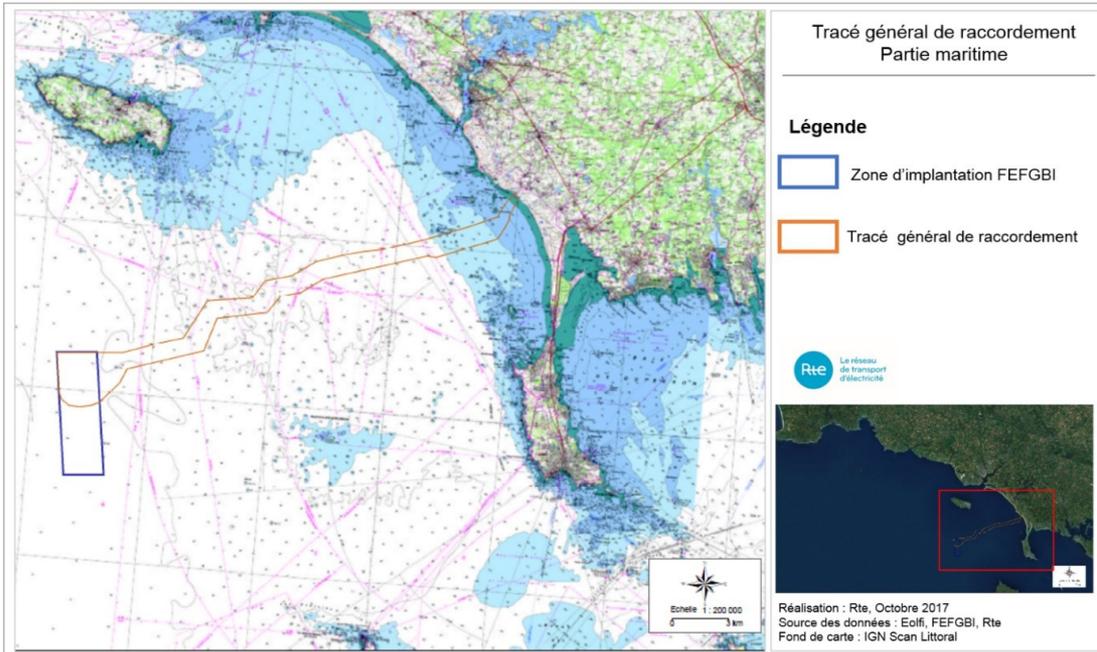

## Chambre d'atterrage




# Tracé général de raccordement à terre

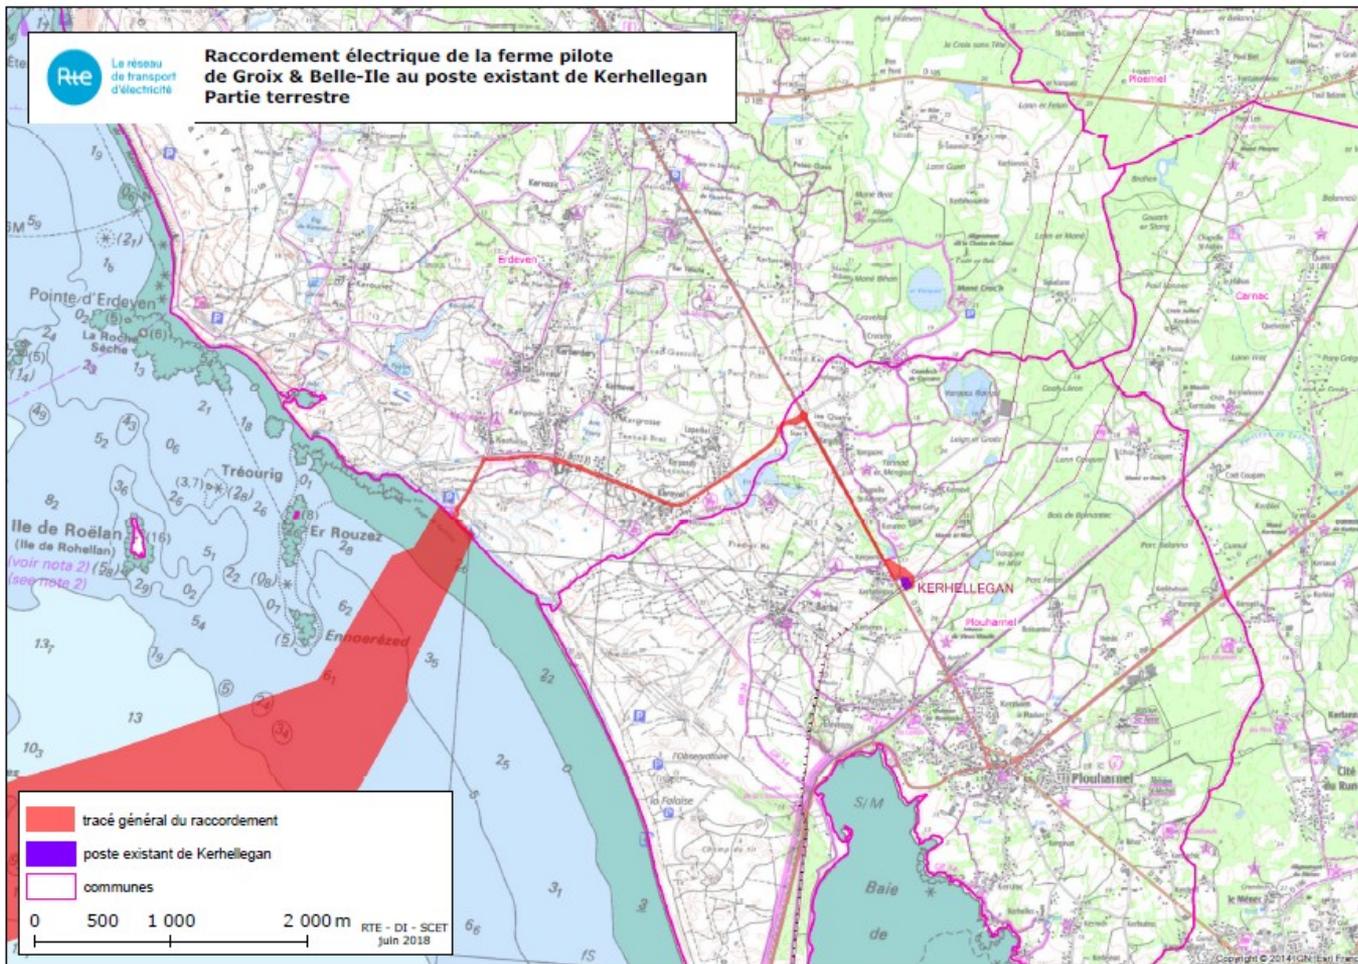

Etude complémentaire  
Juillet 2018

➔ Un tracé évitant les habitats à laminaires

## HABITATS MARINS SUBTIDIAUX

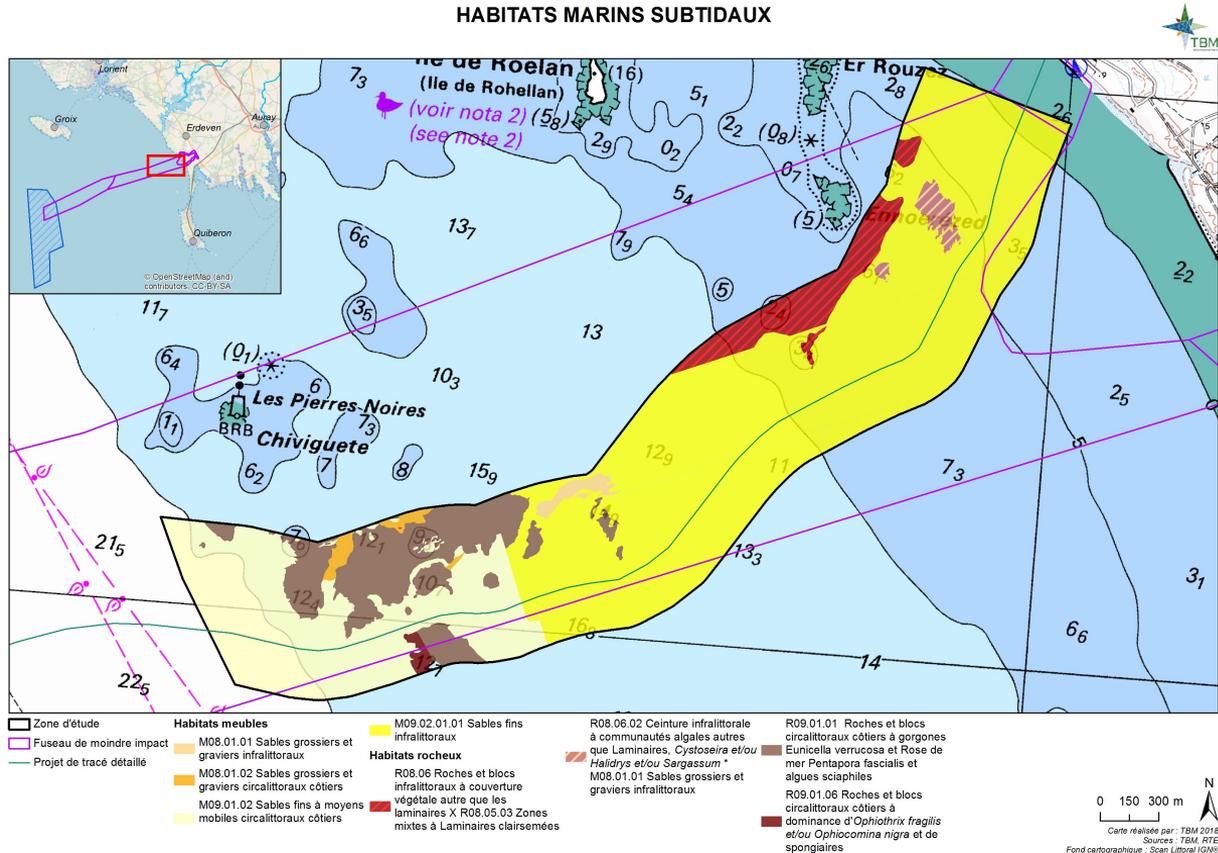




# Etudes techniques

## ❖ Relevés topographiques sur la plage de Kerhillio

- Prévus sur 2 ans (2017-2019)
- 6 relevés depuis le printemps 2017
- Tendence au rechargement de sable après les tempêtes hivernales
- ➔ Poursuite des relevés après 2019

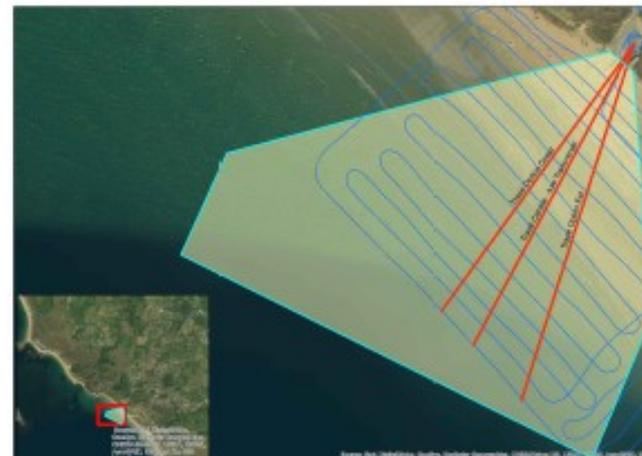



# Prévisionnel des opérations en mer en 2019

## ❖ UXO (prévisionnel et selon aléas météo)

- Période 15 juin – 15 septembre: 4 semaines d'intervention en mer
- Après 15 septembre: couverture de la zone côtière (max 3 km de la côte), estran et parking bitumé (opérateurs à pied)

## ❖ Archéologie en mer (DRASSM)

- Courant 2019 – mutualisation avec campagne UXO à l'étude

# Planning des travaux



- Discussions avec la Défense et les collectivités locales sur les conditions de réalisation des travaux en mer et sur plage de Kerhillio
